


INFORME DE PROYECTO · VERSIÓN PÚBLICA

# Un refugio para Bajo Calima y el Chocó

Sismo del 10 de agosto de 2026 · Bajo Calima, Buenaventura

*Para donantes y aliados: cifras agregadas, sin datos personales.*

GASTOS EJECUTADOS

**13.058.137,69** COP

**2.408,55** EUR

*Transparencia: el detalle de cada gasto y su justificación está en el presupuesto anexo.*

| | |
|---|---|
| IDENTIFICADOR | INF-REF26-v1 |
| VERSIÓN | 1 |
| CIERRE DEL EVENTO | octubre de 2026 |
| ENTIDAD EMISORA | FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 |

# Contenido

**Ficha del informe** . . . . 4

**Resumen ejecutivo** . . . . 5

**Origen y trazabilidad de los fondos** . . . . 6

Uso consolidado de los aportes recibidos . . . . 6

**Contexto** . . . . 8

**1. Introducción** . . . . 10

**2. Contexto y justificación** . . . . 11

**3. Objetivos y beneficiarios** . . . . 12

3.1 Objetivos . . . . 12

3.2 Marco lógico y teoría del cambio . . . . 12

3.3 Beneficiarios e impactos . . . . 13

**4. Descripción de la acción** . . . . 15

**5. Recursos humanos, materiales, logísticos y financieros** . . . . 16

5.1 Logística del evento . . . . 16

**6. Gobernanza y responsabilidades** . . . . 18

6.1 Riesgos, seguridad y protección . . . . 18

6.2 Enfoque de género y diferencial . . . . 18

6.3 Protección de las personas vulnerables y de los menores . . . . 19

6.4 Impacto ambiental . . . . 19

6.5 Conformidad con el Régimen Tributario Especial . . . . 19

Organigrama de la Fundación (octubre de 2026) . . . . 20

**7. Impactos y resultados** . . . . 21

7.1 Análisis según los criterios del CAD de la OCDE . . . . 21

7.2 Norma Humanitaria Esencial (CHS) y Manual Esfera . . . . 21

7.3 Beneficio económico, social y cooperativo . . . . 22

**8. Indicadores cuantitativos y cualitativos** . . . . 24

**9. Comunicación y archivo** . . . . 25

**10. Presupuesto, gastos reales, financiación y justificantes** . . . . 26



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

10.1 Previsto, real y diferencia . . . 26
10.2 Cómo leer los niveles de prueba . . . 26
10.3 Detalle de los gastos . . . 27
10.4 Trazabilidad de los fondos . . . 30
10.5 Dinero que no pasó por la Fundación . . . 30
10.6 Gastos olvidados o probables, y diferencias con el informe oficial . . . 30
10.7 Por qué faltan algunos soportes . . . 31

**11. Dificultades y ajustes . . . 32**

**12. Aprendizajes y recomendaciones . . . 33**

**13. Próximos pasos . . . 34**

**Fotografías . . . 35**

**14. Anexos . . . 40**

**Declaración de conformidad . . . 41**



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# Ficha del informe

| | |
|---|---|
| **Emisión** | Informe emitido el 31 de octubre de 2026, versión 1, consolidación documental ex post |
| **Identificador** | INF-REF26-v1 |
| **Versión** | 1. El informe oficial de misión del 27 de septiembre de 2026 (anexo 1 de la versión completa) se conserva sin cambios; este informe lo completa con el dinero realmente salido y los referenciales humanitarios. |
| **Fecha** | 31 de octubre de 2026 |
| **Entidad emisora** | FUNDACION PHOENIX INICIATIVE, NIT 901899379-2, inscripción S0715224, Rivera (Huila). Una sola entidad emisora. |
| **Proyecto** | Un refugio para Bajo Calima y el Chocó (código REF26) |
| **Período** | Tres fases: preparación logística de unos 20 días antes de la obra (septiembre de 2026); intervención en Bajo Calima del 26 de septiembre de 2026 al 28 de septiembre de 2026, según las fotos fechadas, con las noches del 25 y del 26 en Cali y en el Lago Calima en el camino de ida; seguimiento y continuidad hasta la próxima misión, en enero de 2027 |
| **Lugar** | Comunidad afrocolombiana de Bajo Calima, zona rural del distrito de Buenaventura (Valle del Cauca): Institución Educativa Niño Jesús de Praga y hogar infantil Los Corderitos. Destino inicial previsto: Chachajo, bajo río San Juan (Chocó). |
| **Tipo de acción** | Respuesta humanitaria de emergencia tras el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026: aulas temporales en guadua y entrega de víveres |
| **Presupuesto previsto** | Ninguno escrito antes de salir: la misión se decidió en menos de dos semanas (informe oficial, capítulo 10) |
| **Gasto real** | 13.058.137,69 COP y 2.408,55 EUR, en su moneda de origen y nunca sumados |
| **Diferencia** | No calculable sin presupuesto previo. El informe oficial declaraba 16.100.000 COP de gastos estimados; la sección 10.6 explica la diferencia con el gasto real. |
| **Fuente de las cifras** | Base de datos de los proyectos de la Fundación (BASE_PROYECTOS.xlsx, 31 de octubre de 2026): ficha REF26, hojas Gastos, Salidas, Fuentes, Beneficiarios_Impactos, Medios y Cuadre. Diferencia de cuadre: cero. |
| **Registro de justificantes** | Sección 10. Las piezas están en la versión completa, reservada al contador. |
| **Registro de autorizaciones de imagen** | Autorizaciones de imagen firmadas en todos los eventos (declarado; archivo en poder del representante legal). Ninguna persona de la comunidad se nombra. |
| **Monedas** | Pesos colombianos (COP) y euros (EUR), presentados por separado |
| **Estado del documento** | Firmado por el representante legal; para revisión del contador. No enviado, no publicado. |

Metadatos exigidos por el referencial Phoenix para todo informe oficial: identificador, versión, presupuesto previsto, real y diferencia, registro de justificantes y de autorizaciones de imagen.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# Resumen ejecutivo

*Somos una comunidad resistente y alegre, a pesar de todo. (Lideresa de la comunidad de Bajo Calima, septiembre de 2026)*

**3**
**aulas temporales en guadua**
montadas con la comunidad; acabados a cargo del aliado técnico

**175**
**familias con víveres o ayuda**
declarado por el representante legal

**13.058.137,69 COP**
**salidos de la cuenta de la Fundación**
más 2.408,55 EUR de pasajes aéreos pagados por una empresa mecenas

**58.137,69 COP**
**con pieza completa**
el resto se reconstruye, se estima o se declara (sección 10.2)

**Qué pasó.** El 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en la zona de San José del Palmar (Chocó) golpeó el occidente de Colombia. En Bajo Calima, zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), casas, la escuela y el hogar infantil se vinieron abajo. La comunidad salía de meses de confinamiento por el conflicto armado.

**Qué hicimos.** Seis voluntarios de la Fundación salieron de Rivera (Huila) con un aliado técnico especializado en guadua. Sin lancha para llegar al destino previsto en el río San Juan (Chocó), el equipo decidió en Buenaventura ir a Bajo Calima. En tres días de obra, con 10 a 20 personas de la comunidad cada día, se montaron tres aulas temporales en guadua para los estudiantes de 10.° y 11.° y los niños del hogar infantil. Se entregaron víveres casa por casa a 175 familias, según el representante legal.

**Cuánto costó.** Salieron de la cuenta de la Fundación 13.058.137,69 COP: dos transferencias de anticipo al representante legal, más impuestos bancarios. Una empresa mecenas pagó además 2.408,55 EUR de pasajes aéreos. Los paneles de guadua los pagó la campaña de donaciones del aliado, fuera de la contabilidad de la Fundación: no se cuentan aquí.

**Qué tan probado está.** Solo 58.137,69 COP tienen pieza completa (impuestos bancarios). 3.551.924 COP se reconstruyen con facturas a nombre del representante legal o con declaraciones del informe oficial; 7.244.806 COP son estimación (volumen del informe x precio público), y 2.203.270 COP quedan como saldo declarado, por legalizar. No se conservaron facturas durante la misión: es la principal lección.

**Qué sigue.** Legalizar los anticipos con una relación de gastos firmada, continuar el seguimiento en curso con el Consejo Comunitario sobre el uso y el estado de las aulas, y preparar la misión de enero de 2027 con presupuesto previo, convenio escrito y mecanismo de quejas.

Previsto, realizado, resultado, prueba y próxima etapa se distinguen en la sección 7. Las cifras del sismo vienen de fuentes públicas, citadas en la sección Contexto con su fecha de corte.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# Origen y trazabilidad de los fondos

Esta sección es la misma en todos los informes de la Fundación. Dice primero de dónde vino el dinero de este proyecto y después cómo se usaron todos los aportes recibidos de la asociación francesa, proyecto por proyecto, hasta el saldo en cuenta.

Los recursos de este proyecto provienen principalmente de aportes transferidos por la Fondation Phoenix Initiative France (asociación francesa, ley de 1901, entidad jurídica distinta) a la Fundación Phoenix Iniciative, a partir de las donaciones que esa asociación recibió. De los 13.058.137,69 COP gastados, 13.058.137,69 COP se pagaron desde la cuenta de la Fundación que recibe esos aportes.

Gastos pagados directamente por otras entidades o personas, por cuenta de la Fundación:

- **SARL Sarramea (mecenazgo de empresa)** : 2.408,55 EUR. Fondos de la SARL Sarramea, mecenazgo de empresa (convenio del 01/12/2024, documento DA-05).

| Fecha | Operación Alianza | EUR enviados | COP abonados | COP usados por este proyecto |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 00537019 | 4.000 EUR | 15.192.645,10 COP | 1.146.960 COP *estimación* |
| 04/09/2026 | 00570370 | 20.000 EUR | 72.442.684,80 COP | 11.911.177,69 COP *estimación* |
| **Total** | | | | **13.058.137,69 COP** |

Cada transferencia se atribuye a los gastos en el orden de llegada del dinero (primero en entrar, primero en salir): la columna de uso es una estimación. EUR y COP no se suman: el monto en pesos es el abonado en la cuenta tras la venta de divisas.

## Uso consolidado de los aportes recibidos

RECURSOS RECIBIDOS EN LA CUENTA DE LA FUNDACIÓN (ALIANZA)

| Concepto | EUR | COP |
|---|---|---|
| Aportes transferidos por la Fondation Phoenix Initiative France (18 transferencias) | 158.900 EUR | 660.570.306,68 COP |
| Rendimientos financieros del Fondo | no aplica | 229.938,82 COP |
| Otros abonos de la cuenta (certificación MU-06): rendimientos del Fondo en 2026 y comisiones de venta de divisas, conciliados con los extractos de Alianza | no aplica | 2.280.760,58 COP |
| **Total recibido según la certificación MU-06** | | **663.081.006,08 COP** |
| Redondeos de tasa en las ventas de divisas | | 0,70 COP |

USO DE ESOS RECURSOS POR PROYECTO Y NIVEL DE PRUEBA (COP)


| Proyecto | Soportado | Probable | Reconstruido | Estimado | Declarado | Total COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navidad 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Semana Phoenix 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Vannes 2025 | 9.892,46 | 2.427.796,24 | 6.991.952 | 160.000 | 0 | **9.589.640,70** |
| Semana Phoenix 2026 | 13.204.644,87 | 14.110.000 | 21.000.547,86 | 18.134.000 | 6.376.563,25 | **72.825.755,98** |
| **Refugio Bajo Calima** (este proyecto) | 58.137,69 | 0 | 3.551.924 | 7.244.806 | 2.203.270 | **13.058.137,69** |
| Reforestación con cacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Alianza | 982.882,20 | 207.995.000 | 0 | 0 | 35.041.234,06 | **244.019.116,26** |
| Libro | 21.084.743,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21.084.743,72** |
| Territorio Phoenix | 154.724.744,96 | 12.945.000 | 2.665.600 | 680.000 | 16.000.000 | **187.015.344,96** |

| Proyecto | Soportado | Probable | Reconstruido | Estimado | Declarado | Total COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vannes 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Funcionamiento | 39.559.300,39 | 33.845.450 | 149.900 | 20.000 | 39.916.159,15 | **113.490.809,54** |
| **Total utilizado** | **229.624.346,29** | **271.323.246,24** | **34.359.923,86** | **26.238.806** | **99.537.226,46** | **661.083.548,85** |
| Saldo en cuenta al 9 de octubre de 2026 | | | | | | 1.997.457,93 COP |
| **Control: recibido + redondeos - utilizado - saldo** | | | | | | **0 COP** |

| Pagos directos de la asociación francesa (aporte en especie, no transferido; EUR) | EUR |
|---|---|
| Vannes 2025 | 6.058,14 EUR |
| Alianza | 27.752,98 EUR |
| Libro | 7.194,38 EUR |
| **Total** | **41.005,50 EUR** |

Fondation Phoenix Initiative France y Fundación Phoenix Iniciative son dos entidades jurídicas distintas. COP y EUR nunca se suman. Los proyectos que no usaron la cuenta (« - ») se pagaron directamente por otras entidades: ver cada informe.

## Del aporte en Francia a cada proyecto

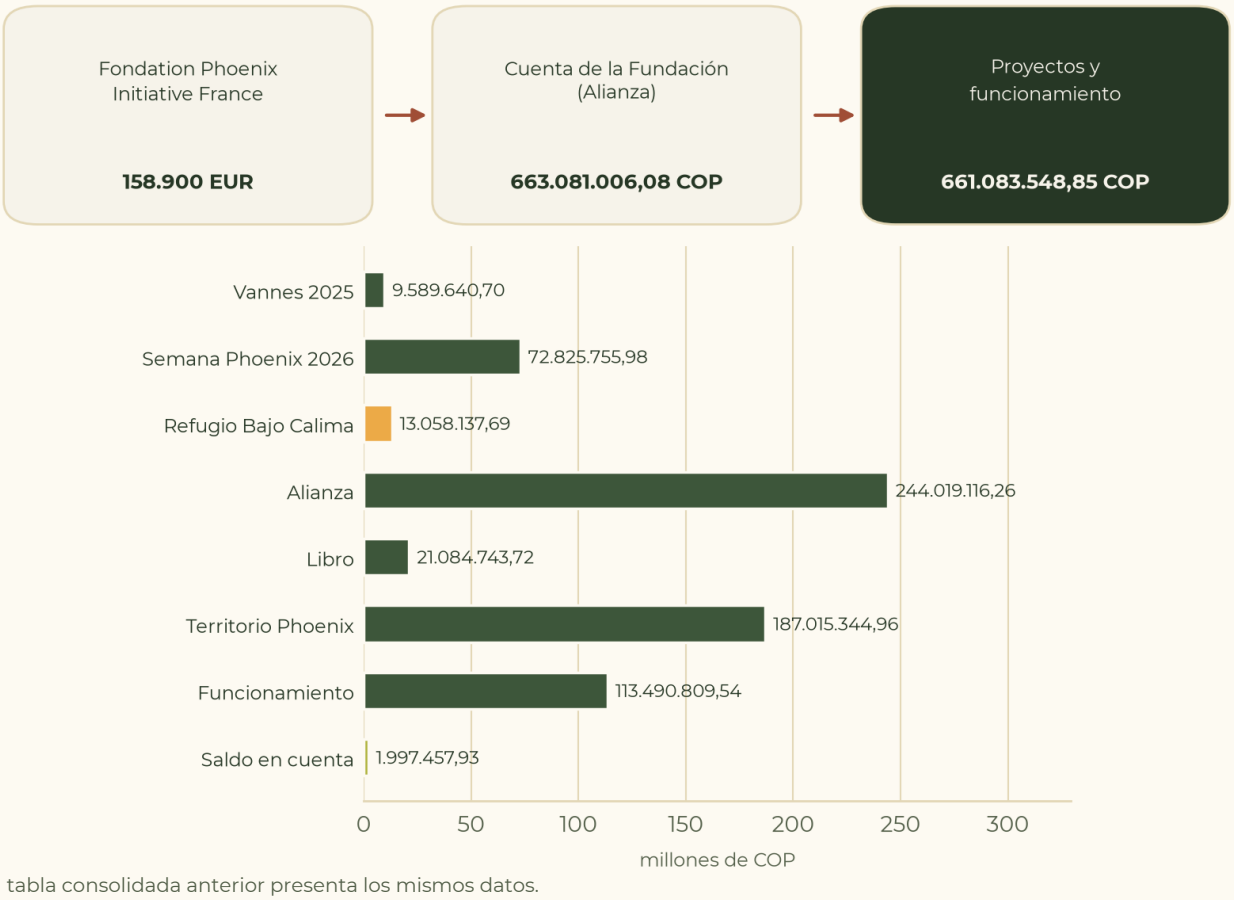


La tabla consolidada anterior presenta los mismos datos.

# Contexto

Datos públicos sobre el sismo, Buenaventura y Bajo Calima, con fecha de corte del 31 de octubre de 2026. Cada dato lleva su fuente en nota. Cuando las fuentes no coinciden, se citan todas: este informe no elige una cifra en silencio.

- El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el USGS coinciden en la magnitud y sitúan el epicentro en la zona de San José del Palmar (Chocó), con dos soluciones de localización distintas.[1]
- Fue un sismo intermedio cuya profundidad varía según el documento: 96 km en la ficha del SGC, 103 km en su boletín explicativo, 116,1 km según el USGS y 88 km en una circular de la UNGRD. Se citan las cuatro cifras sin promediarlas.[2]
- El balance cambió con las fechas de corte. El reporte de la UNGRD del 10/10/2026 registra 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 103 desaparecidas. Las personas afectadas a nivel nacional van de 489.862 (mismo reporte) a 778.281 (IFRC, citando el reporte UNGRD del 21/09/2026): las fuentes no concilian esas cifras y este informe no elige una.[3]
- Las viviendas destruidas a nivel nacional también divergen: 36.478 en el consolidado de la UNGRD y 19.143 según el Registro Único de Damnificados, en el mismo documento de la IFRC.[4]
- El epicentro no está en Bajo Calima. Bajo Calima es una zona rural del distrito de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y una de las zonas afectadas. No debe confundirse con el municipio de Calima-El Darién.[5]
- En Buenaventura, las viviendas destruidas varían según la fuente: 954 para la Alcaldía (corte del 25/08/2026), 1.782 según el Registro Único de Damnificados al 07/09/2026 y 1.690 según la Gobernación del Valle el 07/10/2026.[6]
- No existe un balance oficial propio de Bajo Calima. El Consejo Comunitario reportó nueve comunidades afectadas, 142 viviendas totalmente destruidas en Las Colonias y unas 1.000 con daños parciales; la entradilla del mismo artículo habla de 150 colapsadas. El 28/08/2026, un comunicado comunitario hablaba de 40 familias con la vivienda derrumbada en La Colonia: el censo avanzó entre esas dos fechas. La lideresa de la comunidad, en el testimonio recogido por la Fundación, habló de 146 casas destruidas. Se citan las tres cifras con su fuente.[7]
- Tres días después del sismo, la Defensoría del Pueblo constató en Bajo Calima comunidades que dependen del agua lluvia sin el abastecimiento habitual, sectores sin energía y un centro de salud con fisuras y la caída de una pared.[8]
- Al 05/10/2026, el Consejo Comunitario seguía sin apoyo para reconstruir techos y viviendas, aunque estaba inscrito en el censo de damnificados. Los kits de un consorcio humanitario llegaron casi tres semanas después del sismo, según vecinos.[9]
- Un territorio ya vulnerable: en 2018, la pobreza multidimensional alcanzaba el 67,4 % en los centros poblados y la zona rural de Buenaventura, y el 85,25 % de la población del distrito se reconocía negra, afrodescendiente o afrocolombiana.[10]
- En 2025, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la confrontación armada en Bajo Calima: más de 4.000 personas impactadas, sobre todo del Consejo Comunitario del Bajo Calima y del pueblo Wounaan, y 40 confinamientos masivos en el año. La comunidad salía de esa crisis cuando llegó el sismo.[11]
- Ningún padrón público de las ayudas entregadas por comunidad ribereña fue encontrado: no es posible saber, con fuentes públicas, qué recibió exactamente cada comunidad de Bajo Calima.[12]

**Fuentes**

1. SGC, ficha del evento SGC2026pqqmro. sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqqmro/resumen ; USGS, evento us6000tjl2. earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tjl2



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

2. SGC, « Sismo de magnitud 7,4: el SGC resolvió las preguntas más frecuentes », 14/08/2026. www2.sgc.gov.co/Noticias ; UNGRD, Circular 076 del 26/08/2026. portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Circulares/CIRCULAR_76_26082026.pdf

3. Infobae, 10/10/2026, reporte UNGRD 102. infobae.com/colombia/2026/10/10/ ; IFRC, Colombia Earthquake Operation Update 2 (MDRCO036), ReliefWeb, 28/10/2026. reliefweb.int/report/colombia/colombia-earthquake-operation-update-2-mdrco036

4. IFRC, Operation Update 2, ReliefWeb, 28/10/2026. reliefweb.int/report/colombia/colombia-earthquake-operation-update-2-mdrco036

5. Nota de contexto de la Fundación del 31/10/2026, a partir de las fichas del SGC y de la Gobernación del Valle (30/08/2026). valledelcauca.gov.co/publicaciones/90377

6. Alcaldía de Buenaventura, publicado el 31/08/2026. buenaventura.gov.co/articulos ; Danish Refugee Council, evaluación rápida, septiembre de 2026. drc.ngo/media/urxbudyi/drc-col-rpa-buenaventura-earthquake-response-september-2026.pdf ; BLU Radio, 07/10/2026. bluradio.com/regiones/pacifico

7. Caracol Radio, 05/10/2026, declaraciones del representante legal del Consejo Comunitario del Bajo Calima. caracol.com.co/2026/10/05/ ; Proceso de Comunidades Negras y Consejo Comunitario, 28/08/2026. renacientes.net/2026/08/28/ ; Informe oficial de misión de la Fundación, 27/09/2026, testimonio de la lideresa comunitaria.

8. Defensoría del Pueblo, seguimiento a la respuesta institucional, corte del 13/08/2026. defensoria.gov.co

9. Caracol Radio, 05/10/2026. caracol.com.co/2026/10/05/ ; EFE vía Eje21, 30/08/2026. eje21.com.co/2026/08/

10. DANE, medida municipal de pobreza multidimensional, Censo 2018. dane.gov.co ; Gobernación del Valle, perfil de Buenaventura. comunales.valledelcauca.gov.co

11. Defensoría del Pueblo, 19/05/2025. defensoria.gov.co

12. Búsqueda documental de la Fundación del 31/10/2026: no encontrado.

# 1. Introducción

Este informe cuenta la primera respuesta humanitaria de emergencia de la FUNDACION PHOENIX INICIATIVE, y su primera acción fuera del Huila: la misión « Un refugio para Bajo Calima y el Chocó », en septiembre de 2026, siete semanas después del sismo del 10 de agosto de 2026.

El título conserva el nombre de la campaña original, « Un refugio para el Chocó », y añade el lugar donde la Fundación intervino de verdad: Bajo Calima está en el Valle del Cauca, no en el Chocó. La campaña de 2027 sigue mirando a las dos zonas.

Sigue el índice oficial de informe de la red Phoenix (14 puntos) y lo completa con lo que piden los referenciales de la ayuda humanitaria y del desarrollo: contexto con fuentes, marco lógico y teoría del cambio, beneficiarios en tres niveles, tabla de indicadores, criterios del CAD de la OCDE, los nueve compromisos de la Norma Humanitaria Esencial (CHS) y el Manual Esfera, trazabilidad de los fondos, riesgos y protección, conformidad con el Régimen Tributario Especial, gastos olvidados o probables, y una declaración de conformidad. Ningún donante institucional financió esta misión: estos referenciales se usan como buena práctica.

Lo escribimos con cuatro palabras en mente: transparencia, justificación, buen sentido y buena voluntad. Cada cifra viene de la base de datos de los proyectos de la Fundación y lleva su nivel de prueba. Lo que no sabemos, lo decimos.

Esta versión pública está pensada para donantes y aliados: presenta cifras agregadas, sin datos personales. Las imágenes de la comunidad que puedan acompañarla muestran la obra y la acción colectiva, sin nombres.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# 2. Contexto y justificación

**Un sismo sobre una crisis.** Bajo Calima es un corregimiento rural de Buenaventura, a orillas del río Calima y a unos 20 km de la zona urbana, habitado sobre todo por comunidades negras organizadas en consejo comunitario. Antes del sismo vivía confinamientos por la confrontación entre grupos armados, una pobreza rural alta y un acceso frágil al agua y a la energía (sección Contexto).

**Lo que vio el equipo.** Según la lideresa de la comunidad, el sismo destruyó 146 casas y dañó casi todas las demás; los salones de la escuela y del hogar infantil colapsaron y los estudiantes de 10.° y 11.° no tenían dónde estudiar. El Consejo Comunitario dio a la prensa, el 05/10/2026, la cifra de 142 viviendas destruidas en Las Colonias. Las dos cifras se citan: la primera es un testimonio, la segunda una declaración pública del Consejo.

**Por qué la Fundación.** Un aliado de la Fundación pidió su apoyo a la campaña « Un refugio para el Chocó », que prefabricaba paneles de guadua en Pitalito (Huila). En menos de dos semanas, la Fundación decidió aportar fondos y desplazar un equipo. La misión responde a tres principios de la Fundación: prioridad a las mujeres y a los niños, apoyo a las comunidades vulnerables, y hacer su parte en el terreno en lugar de financiar a distancia.

> LO QUE LA MISIÓN NO PRETENDÍA
> La Fundación no es una organización humanitaria especializada. Esta misión no reconstruyó viviendas, no atendió agua, saneamiento ni salud, y no reemplaza la respuesta del Estado. Llevó tres aulas temporales y víveres a una comunidad que, al momento de la misión, no veía a otras organizaciones en su territorio, según el informe oficial.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# 3. Objetivos y beneficiarios

## 3.1 Objetivos

- **General:** aportar una respuesta concreta y rápida a las comunidades del Pacífico afectadas por el sismo, con estructuras en guadua dignas, seguras y replicables.
- **Específico 1:** construir entre 3 y 5 estructuras (aulas o refugios familiares) en guadua prefabricada.
- **Específico 2:** entregar el material financiado por la campaña: paneles de guadua, lona plástica, polines y latillas.
- **Específico 3:** devolver a los niños, niñas y adolescentes un espacio seguro para retomar clases.
- **Específico 4:** demostrar en el terreno la construcción en guadua como solución de emergencia.

## 3.2 Marco lógico y teoría del cambio

El marco lógico relaciona cada nivel con su indicador, su medio de verificación y sus supuestos. La teoría del cambio lo resume en cuatro pasos: los dos primeros están probados por el informe oficial y las fotos; los dos últimos son lo que la misión busca, sin medición al 31/10/2026.

| Nivel | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Objetivo general** | Aportar una respuesta concreta y rápida a las comunidades del Pacífico afectadas por el sismo del 10/08/2026. | Comunidad atendida en las ocho semanas siguientes al sismo | Informe oficial de misión; fotos fechadas | Acceso seguro al territorio; acuerdo de la comunidad |
| **Objetivo específico** | Devolver a los estudiantes y a los niños del hogar infantil un espacio seguro para estudiar. | Aulas en uso, según el seguimiento con el Consejo Comunitario | Seguimiento con el Consejo Comunitario (en curso) | Acabados terminados; mantenimiento por la comunidad |
| **Resultado 1** | Estructuras temporales en guadua construidas. | Meta: 3 a 5 estructuras. Alcanzado: 3 aulas | Informe oficial, capítulo 8; fotos del 26/09/2026 al 28/09/2026 | Paneles financiados por la campaña del aliado |
| **Resultado 2** | Familias con víveres de primera necesidad. | Familias atendidas: 175 (declarado) | Declaración del representante legal; fotos de la entrega | Víveres comprados con el anticipo de la misión |
| **Resultado 3** | Técnica de la guadua transmitida a la comunidad. | 10 a 20 personas por día en la obra | Informe oficial, capítulos 5 y 7 | Participación voluntaria de la comunidad |
| **Actividades** | Viaje, transporte de paneles, compra de madera, montaje, entrega de víveres, coordinación diaria. | 3 días de obra; equipo de 6 voluntarios | Informe oficial; hoja Gastos de la base | Vehículo y alojamiento disponibles |



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

**ACTIVIDADES**
- Viaje del equipo desde Rivera y cambio de destino decidido en Buenaventura
- Transporte a mano de los paneles de guadua y compra de madera en Buenaventura
- Montaje de tres estructuras con 10 a 20 personas de la comunidad cada día
- Entrega de víveres casa por casa

→

**PRODUCTOS**
- 3 aulas temporales en guadua
- 175 familias con víveres o ayuda (declarado)
- 10 a 20 personas que practicaron la técnica de la guadua

→

**EFECTOS**
- Estudiantes de 10.° y 11.° y niños del hogar infantil con un espacio para retomar clases
- Familias con un apoyo alimentario inmediato
- Una técnica de construcción local conocida en la comunidad

→

**IMPACTO**
- Continuidad educativa mientras se reconstruye la escuela
- Una comunidad mejor preparada para reconstruir con guadua

Supuestos: el aliado técnico termina los acabados; el Consejo Comunitario mantiene y usa las aulas; la escuela no recibe antes una infraestructura definitiva que haga inútiles las aulas temporales. Los efectos y el impacto no se han medido al 31/10/2026: describen la lógica de la acción.

## 3.3 Beneficiarios e impactos

Los beneficiarios se presentan en tres niveles que nunca se suman entre sí. El nivel directo se cuenta en un documento o se declara; el indirecto se estima con un método público; el potencial es una proyección. Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) se citan como contribución, no como resultado medido.

### Beneficiarios directos

Personas que participaron o recibieron algo, contadas en un documento.

| Grupo | Cantidad | Método | Fuente | Estado | ODS |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aulas construidas** aulas temporales en guadua para la escuela de Bajo Calima | **3** | conteo del informe oficial | informe oficial de misión, capítulo 8 | comprobado | contribuye a ODS 4, ODS 11 |
| **Estudiantes y niños del hogar infantil** estudiantes de 10.° y 11.° grado y niños del hogar infantil Los Corderitos | **50 a 100 (estimación)** | estimación del informe oficial, sin lista de estudiantes | informe oficial, capítulo 7 | estimación | contribuye a ODS 4 |
| **Personas de la comunidad en la obra** participaron cada día en el montaje y practicaron la técnica de la guadua | **10 a 20 (estimación)** | estimación del informe oficial | informe oficial, capítulo 5 | estimación | contribuye a ODS 8, ODS 11 |
| **Familias con víveres o ayuda** entrega casa por casa | **175** | declarado por el representante legal el 31/10/2026; sin lista de entrega | representante legal | declarado | contribuye a ODS 2 |

### Beneficiarios indirectos

Personas alcanzadas por efecto de la acción; cifra estimada con un método público. No se suma al nivel directo.

| Grupo | Cantidad | Método | Fuente | Estado | ODS |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personas en los hogares de los estudiantes** personas que viven en los hogares de los estudiantes y niños | **190 a 380 (estimación)** | estimación: 50 a 100 estudiantes x 3,8 personas por hogar (Buenaventura); no se suma al nivel directo | DANE, Censo 2018, ficha de Buenaventura: 3,8 personas por hogar | estimación | contribuye a ODS 4, ODS 11 |

| Grupo | Cantidad | Método | Fuente | Estado | ODS |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personas en las familias con víveres**<br>personas de los hogares que recibieron víveres o ayuda | **665 (estimación)** | estimación: 175 familias x 3,8 personas por hogar; no se suma al nivel directo | DANE, Censo 2018, ficha de Buenaventura: 3,8 personas por hogar | estimación | contribuye a ODS 2 |

## Alcance potencial

Lo que la acción hace posible a futuro: proyección, no resultado.

| Grupo | Cantidad | Método | Fuente | Estado | ODS |
|---|---|---|---|---|---|
| **Seguridad y continuidad escolar**<br>un espacio seguro para retomar clases después del sismo | **sin cifra** | proyección | informe oficial, objetivos | proyección | contribuye a ODS 4, ODS 11 |

Personas en los hogares: con 175 familias y 3,8 personas por hogar (DANE, Censo 2018, Buenaventura), la estimación es de 665 personas. Es una estimación: el tamaño real de los hogares de Bajo Calima no se midió y no se suma a los beneficiarios directos.

Destino inicial: la comunidad indígena de Chachajo, en el bajo río San Juan (Chocó), con dos escuelas. No se llegó por falta de lancha (sección 11): sus estudiantes no se cuentan como beneficiarios.

# 4. Descripción de la acción

**Dónde.** Comunidad de Bajo Calima, zona rural del distrito de Buenaventura (Valle del Cauca): Institución Educativa Niño Jesús de Praga y hogar infantil Los Corderitos.

**Cuándo.** La misión tiene tres fases. La obra en Bajo Calima duró tres días, del 26 de septiembre de 2026 al 28 de septiembre de 2026, según las fotos fechadas; el informe oficial indicaba del 25 al 27. La precedió una preparación logística de unos 20 días y la sigue una actividad continua hasta la próxima misión, en enero de 2027.

| Fase | Qué incluye | Costo en la base de datos |
|---|---|---|
| Preparación (unos 20 días antes de la obra) | Logística: vehículo, víveres, herramientas, coordinación con el aliado técnico y con la comunidad | Pasajes aéreos comprados en agosto (1.146.960 COP y 2.408,55 EUR); el resto: sin salida identificada a la fecha |
| Intervención (viaje y obra, del 24/09/2026 al 30/09/2026 aproximadamente) | Viaje, alojamiento, obra de tres días, víveres, regreso | Transferencias de septiembre de 2026 (13.000.000 COP), repartidas en la sección 10 |
| Seguimiento y continuidad (hasta enero de 2027) | Mantenimiento, comunicación, secretaría, contabilidad y jurídico | Sin salida identificada a la fecha |

**Qué.**

- Transporte a mano de todos los paneles de guadua prefabricados hasta el sitio de la escuela.
- Compra y corte de madera para los montantes en un aserradero de Buenaventura.
- Montaje de los paneles y armado de tres estructuras, con la comunidad todos los días.
- Entrega de víveres de primera necesidad casa por casa, por dos embajadoras de la Fundación.
- Coordinación diaria con el Consejo Comunitario y la dirección de la escuela.
- Testimonios grabados con acuerdo de las personas y autorizaciones de imagen firmadas (declarado).

**Momentos clave.** La entrada en la comunidad bajo la lluvia, entre silencio y miradas, y el primer panel en pie: « la escuela dejó de ser un plano ». Al cierre, el aliado técnico se quedó para los acabados y la entrega de las aulas.

> LO QUE NO SE CAMBIÓ
> Este informe describe la acción según el informe oficial de misión del 27 de septiembre de 2026, firmado por el representante legal. No se añade nada a lo que ese documento dice; lo que difiere de él (fechas, gastos) se señala.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# 5. Recursos humanos, materiales, logísticos y financieros

**Humanos.** Seis voluntarios de la Fundación, sin remuneración; un aliado técnico con su equipo de construcción en guadua y voluntarios; entre 10 y 20 personas de la comunidad cada día.

**Materiales.** Paneles de guadua prefabricados en Pitalito (Huila), lona plástica, polines y latillas, pagados por la campaña del aliado; madera de montantes comprada en Buenaventura; víveres; herramientas traídas desde Rivera, prestadas por la comunidad o compradas en el sitio.

**Financieros.** 13.058.137,69 COP salidos de la cuenta de la Fundación y 2.408,55 EUR de pasajes aéreos aportados por una empresa mecenas. El detalle está en la sección 10.

## 5.1 Logística del evento

Comidas, transporte y alojamiento del equipo se pagaron con el dinero de las transferencias de anticipo, a menudo en efectivo. Cuando no hay factura, la base reconstruye el costo con un método único: personas x días x costo unitario con fuente, solo dentro de una salida real, sin pasar de su monto y siempre marcado como estimación.

| Concepto | Base de cálculo | Nivel | Monto |
|---|---|---|---|
| Vehículo de 9 plazas | 7 días: 2 de ida, 3 de obra, 2 de regreso | estimado | 3.256.974 COP |
| Peajes y combustible | 2 trayectos Cali - Buenaventura; tramo Rivera - Cali sin estimar | estimado | 236.904 COP |
| Comidas del equipo | 6 personas x 7 días x 2 comidas | estimado | 1.008.000 COP |
| Complemento: tercera comida y merienda | 6 personas x 7 días (hoja « Logística por evento ») | estimado | 672.000 COP |
| Hoteles de etapa | 2 noches x 4 habitaciones | estimado | 2.070.928 COP |
| Alojamiento en Cali | noche del 25/09/2026, cuatro facturas | reconstruido | 1.035.464 COP |
| Alojamiento en el Lago Calima | noche del 26/09/2026, reserva Booking | reconstruido | 769.500 COP |
| Pasajes aéreos nacionales | dos integrantes, 03/09/2026 | reconstruido | 1.146.960 COP |
| Pasajes aéreos internacionales | dos integrantes; imputación entera a la misión | declarado | 2.408,55 EUR |

Durante la obra, el equipo durmió en un salón comunal sin costo. La hoja « Logística por evento » de la base aplica el método único a la misión (6 personas, 7 días, 3 comidas y merienda): todo su costo teórico queda cubierto por la transferencia de la misión, que conserva un saldo declarado de 2.203.270 COP.

Todo este cuadro es estimación: personas x días x costo unitario con fuente. Solo absorbe salidas reales sin justificar del mismo pagador y cercanas a la fecha; el costo no cubierto no se suma a los gastos del proyecto.

| | | |
|---|---|---|
| **Tramo** | misión del 22/09/2026 al 28/09/2026 | |
| **Personas** | 6 | |
| **Método del conteo** | 6 voluntarios de la Fundación desde Rivera (informe oficial) | |
| **Días** | 7 | |
| **Comidas por día** | 3 y merienda | |
| **Costo unitario** | 12.000 + 4.000 COP | |
| **Costo teórico** | | 1.680.000 COP *estimación* |
| **Ya justificado por factura (deducido)** | | 0 COP *estimación* |
| **Asignado a salidas reales** | | 1.680.000 COP *estimación* |



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

| | |
|---|---|
| **Costo no cubierto por salidas identificadas** | **0 COP** *estimación* |

# 6. Gobernanza y responsabilidades

**Entidad responsable.** FUNDACION PHOENIX INICIATIVE (NIT 901899379-2), con domicilio en Rivera (Huila). Es la única entidad emisora de este informe. La asociación francesa de la red Phoenix aportó fondos a la Fundación; no es responsable de la misión.

**Dirección.** Colegiada, en el terreno, con el representante legal de la Fundación. Todas las decisiones, incluido el cambio de destino, se tomaron en el sitio, sin enlace de coordinación a distancia.

| Función | Responsable |
|---|---|
| Dirección técnica de la construcción | Aliado técnico (equipo de construcción en guadua @dguadua) |
| Construcción, corte de madera, transporte de paneles | Todo el equipo de la Fundación |
| Entrega de víveres | Dos embajadoras de la Fundación |
| Coordinación con la comunidad | Equipo de la Fundación y Consejo Comunitario de Bajo Calima |
| Acabados y entrega de las aulas | Aliado técnico, tras la salida del equipo |
| Comunicación en terreno | Embajadoras y representante legal |

**Acuerdos.** Ningún convenio escrito con el aliado, el Consejo Comunitario ni la escuela: todo fue verbal. Es un punto a corregir antes de la misión de 2027.

**Dinero de terceros.** La campaña del aliado recaudó, según el informe oficial, más de 10 millones de pesos para los paneles y materiales. Ese dinero no pasó por la Fundación, no se cuenta en este informe y su balance debe pedirse al aliado.

## 6.1 Riesgos, seguridad y protección

| Riesgo | Qué pasó en 2026 | Medida para 2027 |
|---|---|---|
| Conflicto armado en la zona | Ningún incidente. Zona con confinamientos en 2025 y alerta temprana en el Litoral del San Juan en 2026. | Itinerario compartido, contacto local en cada etapa, viajes de día, respeto de las indicaciones del Consejo Comunitario. |
| Transporte fluvial | La lancha prevista no estaba: el destino inicial se abandonó. | Confirmar todo transporte fluvial 48 horas antes, con un plan B escrito. |
| Accidentes en la obra | Lluvia, calor, carga manual de paneles; ningún accidente reportado. | Botiquín, equipo de protección, seguro de los voluntarios (sin seguro documentado a la fecha de emisión). |
| Gastos sin factura | Anticipos gastados en efectivo, sin recibos. | Responsable de caja, factura a nombre de la Fundación, relación de gastos al regresar. |
| Mezcla de dineros | La campaña del aliado y los fondos de la Fundación no se distinguían para el público. | Un solo medio de donación por entidad, nombrada en cada afiche. |
| Imágenes de la comunidad | Fotos y videos con niños y adultos; autorizaciones firmadas (declarado). Algunas fachadas con inscripciones de grupos armados. | Fotos dignas, centradas en la obra y la acción colectiva; ningún nombre; ninguna escena de angustia; ninguna fachada con inscripciones. |

## 6.2 Enfoque de género y diferencial

La comunidad atendida es mayoritariamente afrocolombiana y está organizada en consejo comunitario; la misión trabajó con su lideresa y su Consejo. El equipo de la Fundación tenía dos mujeres de seis personas, y fueron ellas quienes entregaron los víveres casa por casa. La base no registra cuántas mujeres, niñas, niños u hombres recibieron ayuda: no documentado a la fecha de emisión. Para 2027: contar por sexo, edad y pertenencia étnica cuando la comunidad lo acepte, y consultar por separado a las mujeres sobre sus necesidades.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

## 6.3 Protección de las personas vulnerables y de los menores

Las aulas son para estudiantes y niños pequeños, y la comunidad vivía una doble crisis. Las autorizaciones de imagen se firmaron en todos los eventos de la Fundación, los niños con sus padres o representantes (declarado; archivo en poder del representante legal). Por eso la versión pública puede mostrar a la comunidad, niños incluidos, con tres reglas: ningún nombre, ninguna escena de angustia después del sismo, prioridad a la obra y a la acción colectiva. Ningún voluntario estuvo a solas con niños, según declaración del equipo, sin constancia escrita a la fecha de emisión. No hubo código de conducta firmado: se exigirá para 2027, con un punto de contacto para cualquier alerta, conforme a la Ley 1581 de 2012 sobre datos personales.

> DECLARADO
> Autorizaciones de imagen: firmadas en cada evento por los padres de los menores, por el equipo y por las instituciones, según declara el representante legal. Se conservan en los archivos de la Fundación y no se publican. Ningún nombre de niño aparece en este informe.

## 6.4 Impacto ambiental

La guadua es un material local y renovable, y la misión mostró su uso como alternativa al bloque y al zinc. Costos ambientales: transporte de los paneles desde Pitalito, siete días de vehículo, lona plástica, y dos viajes aéreos internacionales para dos integrantes, cuya factura incluye un suplemento de combustible sostenible. No se midió la huella de carbono. Para 2027: más días de obra por día de carretera, y recoger los residuos de la obra.

## 6.5 Conformidad con el Régimen Tributario Especial

La Fundación pertenece al Régimen Tributario Especial (RTE). Cada proyecto se vincula con su actividad meritoria y con el uso de los recursos recibidos, según el Estatuto Tributario (ET).

| Punto del Régimen Tributario Especial | Situación en este proyecto |
|---|---|
| **Actividad meritoria (art. 359 ET)** | Respuesta a un desastre: aulas temporales para una escuela y ayuda alimentaria. Qué actividad meritoria registrada por la Fundación la cubre (educación, desarrollo social, atención de emergencias): la define el contador. |
| **Origen de los recursos (art. 364-5 ET, formato 2532)** | Dinero de la cuenta Alianza de la Fundación, alimentada por aportes de la asociación francesa de la red Phoenix, entidad jurídica distinta, a partir de las donaciones que ella recibió (cooperación internacional) y por rendimientos del fondo; pasajes aéreos aportados en especie por la SARL Sarramea (mecenazgo). Su reporte en el formato 2532 lo decide el contador. |
| **Destinación del excedente (art. 358 ET)** | No aplica a nivel de proyecto: se analiza en las cuentas anuales de la Fundación. |
| **Pagos a cargos directivos (art. 356-1 ET, formato 2531)** | Ningún salario ni honorario a directivos. Las transferencias de la misión pasaron por el representante legal como anticipo de gastos, y se legalizan con una relación de gastos firmada. |
| **Publicación en el registro web (art. 364-5 ET)** | Este informe puede alimentar el informe anual de resultados que la Fundación publica en el registro web del Régimen Tributario Especial, actualizado a más tardar el 30 de junio de cada año. |



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

## Organigrama de la Fundación (octubre de 2026)

Roles del equipo según el organigrama vigente al 31/10/2026. La versión pública no nombra a las personas.

| Ámbito | Roles |
|---|---|
| **Dirección y gobierno** | Fundador y representación legal; presidencia de la Fundación Phoenix Initiative Colombia; presidencia de la Fondation Phoenix Initiative France (entidad jurídica distinta); coordinación de administración y gestión |
| **Asesoría y apoyo** | Asesoría territorial; asesoría reglamentaria; asesoría logística; apoyo a la estrategia económica y financiera; contabilidad |
| **Equipo técnico** | Arquitectura (jefatura y coordinación de proyecto de la misión Phoenix); gestión medioambiental; ingeniería forestal; innovaciones electrotécnicas; materiales ecorresponsables y tecnologías innovadoras |
| **Comunidad y embajadas** | Comunicación y restauración ambiental; cultura; vida saludable; arquitectura responsable; bienestar juvenil y alimentario; cultura y desarrollo comunitario; proyectos agrícolas y desarrollo comunitario |



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# 7. Impactos y resultados

Para cada objetivo: lo previsto, lo realizado, el resultado, la prueba y la próxima etapa.

| Previsto | Realizado | Resultado | Prueba | Próxima etapa |
|---|---|---|---|---|
| 3 a 5 estructuras en guadua | 3 aulas montadas en 3 días | Aulas en pie; acabados a cargo del aliado | Informe oficial; fotos del 26/09/2026 al 28/09/2026 | Fotos de las aulas terminadas |
| Entregar el material de la campaña | Paneles llevados a mano hasta la escuela | Todo el material en el sitio | Informe oficial | Balance de la campaña, a pedir al aliado |
| Un espacio seguro para retomar clases | Aulas para 10.° y 11.° y el hogar infantil | 50 a 100 estudiantes y niños (estimación) | Informe oficial | Seguimiento en curso con el Consejo Comunitario |
| Demostrar la guadua en emergencia | 10 a 20 personas por día en la obra | Técnica practicada por la comunidad | Informe oficial; fotos | Material escrito para la comunidad |
| (No previsto) Víveres | Entrega casa por casa | 175 familias (declarado) | Declaración del representante legal; fotos | Lista de entrega en 2027 |

**Impacto institucional.** Primera misión de la Fundación fuera del Huila, nueva alianza técnica en guadua, equipo de seis voluntarios formado en el terreno, y una invitación formal de la comunidad a volver.

## 7.1 Análisis según los criterios del CAD de la OCDE

| Criterio | Análisis |
|---|---|
| **Pertinencia** | Alta en la intención: la escuela y el hogar infantil habían perdido sus salones y los estudiantes de 10.° y 11.° no tenían dónde estudiar. Sin embargo, la primera necesidad expresada por el Consejo Comunitario en octubre eran los techos de las viviendas, que esta misión no cubrió. No hubo evaluación de necesidades previa: el destino cambió sobre el terreno. |
| **Coherencia** | Coordinada con el Consejo Comunitario, la dirección de la escuela y el aliado técnico. No se registró ante la Alcaldía, la Secretaría de Educación ni los grupos de coordinación humanitaria: el riesgo de duplicación con otras carpas o aulas temporales (por ejemplo las de ACNUR) no se verificó. |
| **Eficacia** | Tres aulas montadas, en el rango previsto de 3 a 5 estructuras; víveres entregados a 175 familias según el representante legal. Los acabados quedaron a cargo del aliado; el seguimiento del uso de las aulas con el Consejo Comunitario está en curso al 31/10/2026. |
| **Eficiencia** | 13.058.137,69 COP salidos de la cuenta de la Fundación y 2.408,55 EUR de pasajes pagados por una empresa mecenas. Con cerca de la mitad del gasto en pesos estimado o declarado, no se calcula un costo por aula ni por familia como dato firme. Los dos días de carretera por trayecto pesaron más que los tres días de obra. |
| **Impacto** | No medido. Las aulas pueden sostener la continuidad escolar mientras se reconstruye la escuela; ningún efecto se afirma sin los resultados del seguimiento en curso. |
| **Sostenibilidad** | Estructuras temporales, mantenidas por la comunidad; técnica de la guadua conocida por 10 a 20 personas. La continuidad depende de la campaña 2027 y de un convenio escrito con el Consejo Comunitario. |

Criterios del CAD de la OCDE (2019), usados como guía de análisis interna, no como evaluación externa.

## 7.2 Norma Humanitaria Esencial (CHS) y Manual Esfera

Los nueve compromisos de la Norma Humanitaria Esencial (edición 2024) sirven aquí de lista de control honesta: qué se cumplió y qué no.

| Compromiso CHS | Situación | Qué se hizo o qué falta |
|---|---|---|
| **1. Asistencia adecuada y pertinente a las necesidades** | en parte | Aulas pedidas por la lideresa para estudiantes sin espacio; víveres de primera necesidad. Sin evaluación de necesidades escrita; los techos de las viviendas, primera necesidad del Consejo Comunitario, quedaron fuera. |



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

| Compromiso CHS | Situación | Qué se hizo o qué falta |
|---|---|---|
| **2. Asistencia en el momento oportuno** | en parte | Llegada unas siete semanas después del sismo, cuando el Consejo seguía sin apoyo para techos. Acabados de las aulas pendientes a la salida del equipo. |
| **3. Comunidades mejor preparadas y más resilientes** | en parte | 10 a 20 personas por día practicaron la técnica de la guadua, local y replicable. Sin formación estructurada ni material escrito dejado a la comunidad. |
| **4. Derechos, información y participación en las decisiones** | en parte | Participación diaria de la comunidad y coordinación con su Consejo; testimonios grabados con acuerdo. Ninguna consulta antes de llegar ni acuerdo escrito. |
| **5. Mecanismos de quejas seguros** | no cumplido | Ningún mecanismo de quejas propuesto a la comunidad. A crear: un número de contacto de la Fundación entregado al Consejo, y una pregunta sobre quejas en el seguimiento en curso. |
| **6. Asistencia coordinada y complementaria** | en parte | Coordinación con el Consejo Comunitario, la escuela y el aliado técnico. Ningún registro ante la Alcaldía ni los grupos de coordinación humanitaria. |
| **7. Mejora continua: la organización aprende** | cumplido en parte | Informe oficial con aprendizajes al día siguiente de la obra, y este informe. Seguimiento con el Consejo Comunitario en curso. |
| **8. Personal y voluntariado competentes y bien gestionados** | en parte | Seis voluntarios con dirección técnica experta. Sin formación humanitaria, sin código de conducta ni compromiso de protección de menores firmado: no documentado a la fecha de emisión. |
| **9. Recursos gestionados de forma eficaz, eficiente y ética** | en parte | Sin presupuesto previo ni facturas durante la misión. La base de datos reconstruye cada peso salido y separa lo probado de lo estimado (sección 10). |

Norma Humanitaria Esencial (CHS), edición 2024, y Manual Esfera 2018, usados como referencia de buena práctica.

**Manual Esfera.** La misión toca dos capítulos técnicos de Esfera. Alojamiento y asentamientos: estructuras temporales con materiales locales y participación de la comunidad, pero sin evaluación técnica escrita de su seguridad estructural ni de su duración. Seguridad alimentaria: víveres entregados sin registro de los hogares ni criterios de selección escritos. Agua, saneamiento e higiene, y salud, necesidades señaladas por la Defensoría, no se atendieron. La Carta Humanitaria y los Principios de Protección se respetaron en la intención (dignidad, no discriminación), sin protocolo escrito.

## 7.3 Beneficio económico, social y cooperativo

ECONOMÍA LOCAL

**Economía local.** Los gastos en pesos de la misión fueron a proveedores colombianos, sobre todo del Valle del Cauca: alquiler del vehículo (3.256.974 COP, estimación), alojamientos en Cali y en el Lago Calima (1.035.464 COP y 769.500 COP), comidas en el camino (1.008.000 COP, estimación), madera de un aserradero de Buenaventura (600.000 COP), peajes y combustible, y víveres comprados para las familias, dentro del saldo declarado. Los pasajes internacionales se pagaron a una aerolínea extranjera. No se calcula ningún efecto multiplicador: no hay fuente para hacerlo.

BENEFICIARIOS

**Beneficio social.** En tres niveles que no se suman (sección 3.3): directo, con 3 aulas, 50 a 100 estudiantes y niños (estimación), 10 a 20 personas en la obra y 175 familias con víveres (declarado); indirecto, unas 665 personas en esos hogares (estimación); potencial, la continuidad escolar mientras se reconstruye la escuela.

| Nivel | Grupo | Cantidad |
|---|---|---|
| Beneficiarios directos | Aulas construidas | **3** |
| Beneficiarios directos | Estudiantes y niños del hogar infantil | **50 a 100 (estimación)** |

| Nivel | Grupo | Cantidad |
|---|---|---|
| Beneficiarios directos | Personas de la comunidad en la obra | **10 a 20 (estimación)** |
| Beneficiarios directos | Familias con víveres o ayuda | **175** |
| Beneficiarios indirectos | Personas en los hogares de los estudiantes | **190 a 380 (estimación)** |
| Alcance potencial | Seguridad y continuidad escolar | **sin cifra** |
| Beneficiarios indirectos | Personas en las familias con víveres | **665 (estimación)** |

Personas alcanzadas por efecto de la acción; cifra estimada con un método público. No se suma al nivel directo.

### COOPERACIÓN FRANCIA-COLOMBIA Y ALIADOS

**Cooperación franco-colombiana.** Los pesos salieron de la cuenta de la Fundación, alimentada por aportes que le transfirió la asociación francesa de la red Phoenix, entidad jurídica distinta, a partir de las donaciones que esa asociación recibió. Una empresa mecenas francesa pagó los pasajes de dos integrantes del equipo. Ninguna donación recibida por la asociación francesa llegó directamente a la Fundación.

### CARÁCTER HUMANITARIO Y VOLUNTARIO

**Carácter humanitario y voluntario.** Los seis integrantes del equipo de la Fundación no recibieron remuneración; la comunidad trabajó en la obra de forma voluntaria; el aliado técnico aportó la dirección de la obra y los acabados. Este trabajo no se valoriza en dinero: no existe una base con fuente para hacerlo.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# 8. Indicadores cuantitativos y cualitativos

La única meta numérica previa era de 3 a 5 estructuras. Las demás columnas dicen lo que se sabe y lo que falta.

| Indicador | Línea de base | Meta | Alcanzado | Fuente y verificación | Desviación |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estructuras construidas** | 0 aulas utilizables en el sitio | 3 a 5 estructuras | 3 aulas | informe oficial, capítulo 8; fotos | Meta mínima alcanzada; acabados pendientes del aliado técnico (estado final no documentado a la fecha de emisión) |
| **Estudiantes y niños con aula** | sin espacio para 10.° y 11.° | no fijada | 50 a 100 (estimación del informe) | informe oficial, capítulo 7 | No calculable sin meta; conteo real no documentado a la fecha de emisión |
| **Familias con víveres o ayuda** | no aplica | no fijada | 175 (declarado) | representante legal, 31/10/2026 | Sin lista de entrega |
| **Personas de la comunidad en la obra** | no aplica | no fijada | 10 a 20 por día | informe oficial, capítulo 5 | No calculable sin meta |
| **Días de obra** | no aplica | 3 | 3 | informe oficial; fotos fechadas | ninguna; obra del 26/09/2026 al 28/09/2026 según las fotos fechadas (el informe oficial indicaba del 25 al 27) |
| **Seguimiento con el Consejo Comunitario** | no aplica | uso y estado de las aulas, quejas | en curso | representante legal, 31/10/2026 | sin cifra a la fecha |
| **Dinero realmente salido** | no aplica | sin presupuesto previo | 13.058.137,69 COP y 2.408,55 EUR | base de datos, ficha REF26 | No comparable |
| **Gasto con nivel « soportado »** | no aplica | todo el gasto | 58.137,69 COP | base de datos, ficha REF26 | No se conservaron facturas durante la misión (sección 10.6) |

**Cualitativos.** El informe oficial describe una relación que pasó de la desconfianza a la curiosidad y luego a la participación diaria, y testimonios filmados de gratitud. La lideresa de la comunidad invitó formalmente a la Fundación a volver. Ningún indicador de satisfacción se midió con un método.

# 9. Comunicación y archivo

- Antes: video de las cuatro embajadoras de la Fundación con llamado a donar, y difusión del afiche de la campaña del aliado.
- Durante: historias en directo en la cuenta de la Fundación y publicaciones en LinkedIn del representante legal.
- Después: una serie de 30 carruseles en Instagram desde el 01/10/2026, 30 publicaciones en LinkedIn, 20 guiones de Reels y una campaña de donaciones para 2027 con el título « Un refugio para Bajo Calima y el Chocó ».
- Informe oficial de misión del 27 de septiembre de 2026, en español, con una traducción de cortesía al francés y al inglés.

> AFICHE DE LA CAMPAÑA DEL ALIADO
> El afiche original de la campaña del aliado mostraba medios de pago a nombre de una persona natural y hablaba de « comunidades indígenas de Buenaventura », cuando la comunidad atendida es afrocolombiana. No se anexa a este informe. Desde el 28/09/2026, la campaña de la Fundación usa tres niveles de aporte (desde 100.000, 500.000 y 6.000.000 COP) y un solo enlace de donación, sin número de cuenta.

Autorizaciones de imagen: firmadas en todos los eventos de la Fundación por los adultos y, para los niños, por sus padres o representantes (declarado; archivo en poder del representante legal). Las imágenes publicadas muestran la obra y la acción colectiva, sin nombres ni escenas de angustia.

Los documentos fuente, fotos y videos se conservan en los archivos de la Fundación.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# 10. Presupuesto, gastos reales, financiación y justificantes

## 10.1 Previsto, real y diferencia

No hubo presupuesto escrito antes de salir. El informe oficial, redactado al cierre de la misión, estimaba 16.100.000 COP de gastos (incluidos 8.000.000 previstos para comunicación) y 4.500.000 de ingresos. Este informe no parte de esas estimaciones: parte del dinero realmente salido, línea por línea. El gasto real es de 13.058.137,69 COP y 2.408,55 EUR. La diferencia con las estimaciones se explica en la sección 10.6.

COP, EUR y USD nunca se suman. Los pasajes internacionales se pagaron en euros: se muestran en euros. Su equivalente en pesos en la base usa la tasa de la venta de divisas Alianza anterior más cercana (07/07/2026); no entra en el total en pesos.

## 10.2 Cómo leer los niveles de prueba

| Nivel | Cómo leer los niveles de prueba |
|---|---|
| ■ **Soportado** | Documento y pago visible en un extracto bancario. |
| ■ **Probable** | Pago en extracto, más una orden, un correo, un informe o un motivo escrito. |
| ■ **Reconstruido** | Actividad probada; el monto viene de un documento parcial (factura a nombre de otro, pago por un intermediario, gasto cubierto por una transferencia). |
| ■ **Estimado** | Actividad probada; monto = volumen probado x precio público con fuente, siempre dentro de una salida de dinero real. Se marca « estimación ». |
| ■ **Declarado** | Pago en extracto; el destino lo afirma el representante legal o se asigna por indicio. |

SOPORTADO
58.137,69 COP tienen pieza completa: el gravamen a los movimientos financieros y la retención en la fuente, leídos en los extractos Alianza.

RECONSTRUIDO
3.551.924 COP son reconstruidos: facturas de alojamiento y pasajes a nombre del representante legal, cubiertas por la transferencia de la Fundación, una reserva pagada en efectivo y la madera declarada en el informe oficial.

ESTIMADO
7.244.806 COP son estimación: vehículo, comidas, hoteles de etapa, peajes y combustible. Cada estimación multiplica un volumen del informe oficial por un precio público con fuente (archivo de reconstrucción de costos, versión 2), y se imputa solo dentro de la transferencia de la misión.

DECLARADO
2.203.270 COP son el saldo declarado de la transferencia: víveres, comunicación en terreno y otros gastos citados por el informe oficial, sin pieza. Por legalizar con una relación de gastos firmada.

DECLARADO
2.408,55 EUR: la factura de los pasajes internacionales existe. Su imputación entera a esta misión es una decisión del representante legal del 31/10/2026: el reparto es declarado.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org


## 10.3 Detalle de los gastos

| Concepto | Rubro | Pagador real | Nivel | Monto |
|---|---|---|---|---|
| **Pasajes aéreos nacionales del 03/09/2026 desde Bogotá, dos integrantes del equipo** | Transporte | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Reconstruido | 1.146.960 COP |
| **Pasajes aéreos internacionales de dos integrantes del equipo, del 03/09/2026 al 05/10/2026** | Transporte | SARL Sarramea (mecenazgo de empresa) | ▪ Declarado | 2.408,55 EUR |
| **Alojamiento en Cali, noche del 25/09/2026** | Alojamiento | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Reconstruido | 1.035.464 COP |
| **Alojamiento Finca Prometeo, Lago Calima, noche del 26/09/2026** | Alojamiento | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Reconstruido | 769.500 COP |
| **Alquiler del vehículo de 9 plazas (7 días: 2 de ida, 3 de obra, 2 de regreso)**<br>Rol: transporte local | Transporte | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Estimado | 3.256.974 COP<br>*estimación* |
| **Comidas del equipo (7 días)**<br>Rol: prestador local de restauración | Alimentación | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Estimado | 1.008.000 COP<br>*estimación* |
| **Hoteles de etapa (ida y regreso, 2 noches, 4 habitaciones)**<br>Rol: alojamiento | Alojamiento | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Estimado | 2.070.928 COP<br>*estimación* |
| **Madera de los montantes (aserradero de Buenaventura)**<br>Rol: prestador local | Material y regalos | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Reconstruido | 600.000 COP |
| **Peajes y combustible Cali - Buenaventura (ida y regreso)**<br>Rol: prestador local | Transporte | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Estimado | 236.904 COP<br>*estimación* |
| **Saldo de las transferencias de la misión sin pieza (víveres, comunicación en terreno y otros gastos declarados)**<br>Rol: prestador local | Otros | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Declarado | 2.203.270 COP |
| **Complemento de comidas del equipo (3 comidas y merienda por día en lugar de 2 comidas)**<br>Rol: prestador local de restauración | Alimentación | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Estimado | 672.000 COP<br>*estimación* |
| **Gravamen a los movimientos financieros (4 x 1000) sobre las salidas del proyecto** | Otros | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Soportado | 52.000 COP |
| **Retención en la fuente sobre rendimientos, al retirar del fondo** | Otros | FUNDACION (cuenta Alianza) | ▪ Soportado | 6.137,69 COP |
| Total COP | | | | **13.058.137,69 COP** |
| Total EUR | | | | **2.408,55 EUR** |



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org


## Gasto por rubro y nivel de prueba (COP)

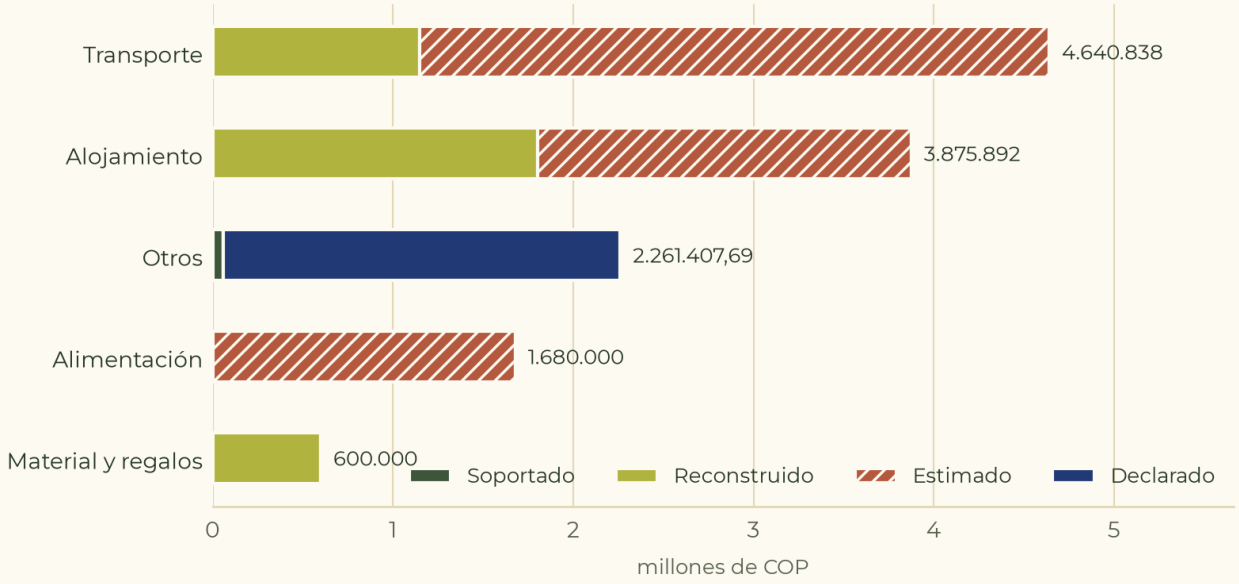


Mismos datos en tabla

| Rubro | Soportado | Reconstruido | Estimado | Declarado | Total COP |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte | 0 COP | 1.146.960 COP | 3.493.878 COP *estimación* | 0 COP | 4.640.838 COP |
| Alojamiento | 0 COP | 1.804.964 COP | 2.070.928 COP *estimación* | 0 COP | 3.875.892 COP |
| Alimentación | 0 COP | 0 COP | 1.680.000 COP *estimación* | 0 COP | 1.680.000 COP |
| Material y regalos | 0 COP | 600.000 COP | 0 COP | 0 COP | 600.000 COP |
| Otros | 58.137,69 COP | 0 COP | 0 COP | 2.203.270 COP | 2.261.407,69 COP |
| **Total** | **58.137,69 COP** | **3.551.924 COP** | **7.244.806 COP** | **2.203.270 COP** | **13.058.137,69 COP** |


## Gasto por rubro y nivel de prueba (EUR)




Mismos datos en tabla

| Rubro | Declarado | Total EUR |
|---|---|---|
| Transporte | 2.408,55 EUR | 2.408,55 EUR |
| **Total** | **2.408,55 EUR** | **2.408,55 EUR** |


## Gasto por nivel de prueba (COP)

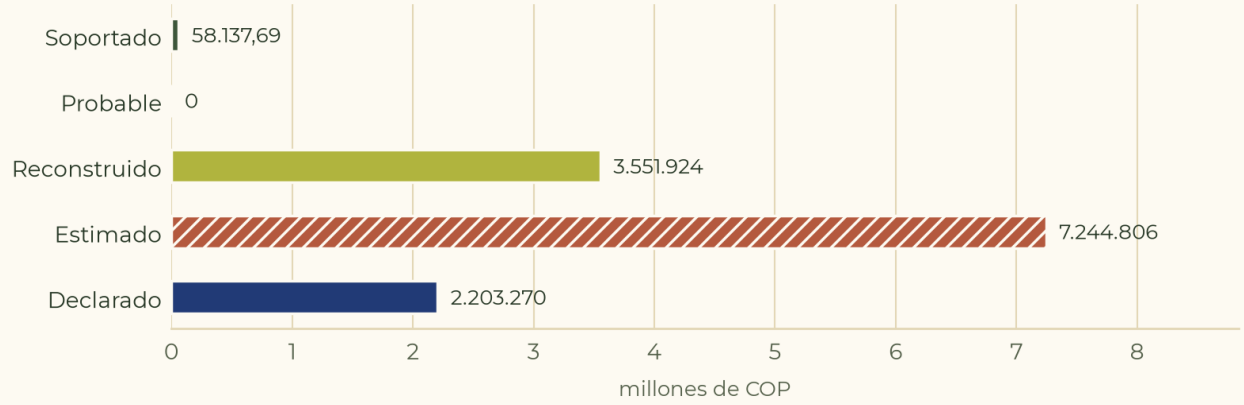


Mismos datos en tabla

| Nivel | Monto |
|---|---|
| Soportado | 58.137,69 COP |
| Probable | 0 COP |
| Reconstruido | 3.551.924 COP |
| Estimado | 7.244.806 COP (estimación) |
| Declarado | 2.203.270 COP |
| **Total** | **13.058.137,69 COP** |

## Gasto por nivel de prueba (EUR)

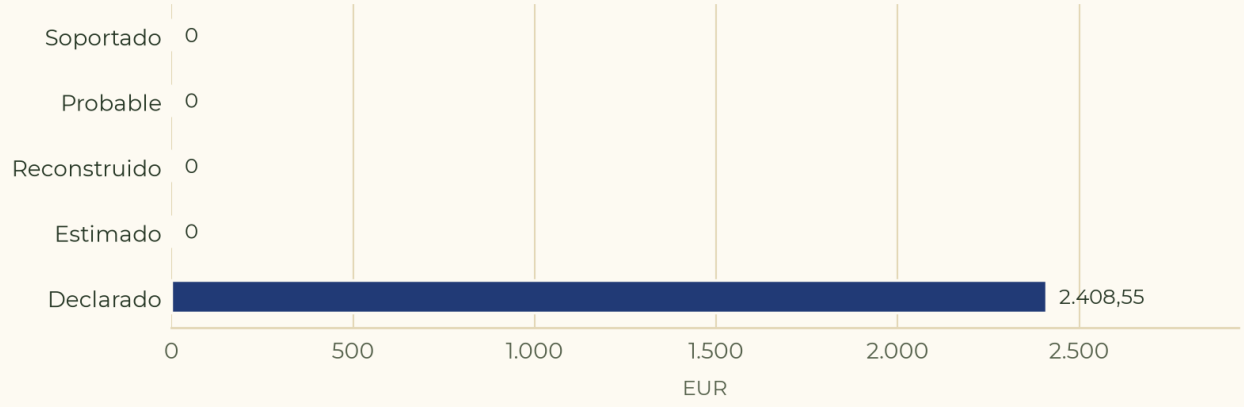


Mismos datos en tabla

| Nivel | Monto |
|---|---|
| Soportado | 0 EUR |
| Probable | 0 EUR |
| Reconstruido | 0 EUR |
| Estimado | 0 EUR |
| Declarado | 2.408,55 EUR |
| **Total** | **2.408,55 EUR** |

## 10.4 Trazabilidad de los fondos

Del dinero que entró hasta cada salida. Primero, quién pagó y de dónde venía su dinero; luego, cada salida real con la parte imputada a esta misión.

| Pagador real | Fuente | Monto |
|---|---|---|
| **FUNDACION (cuenta Alianza)** | Cuenta Alianza de la Fundación, alimentada por aportes que le transfirió la asociación francesa de la red Phoenix (ley de 1901, entidad jurídica distinta), a partir de las donaciones que esa asociación recibió (euros monetizados en Alianza, documento MU-06, anexo A), y por rendimientos del fondo. | 13.058.137,69 COP |
| **SARL Sarramea (mecenazgo de empresa)** | Fondos de la SARL Sarramea, mecenazgo de empresa (convenio del 01/12/2024, documento DA-05). | 2.408,55 EUR |

| Salida | Concepto | Monto de la salida | En este proyecto | Fuera de este proyecto | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| FUND-S13 | Dos transferencias de la cuenta Alianza de la Fundación (22 y 28/09/2026) al representante legal, como anticipo de los gastos de la misión. Por legalizar con relación de gastos.<br>22/09/2026 · FUNDACION (cuenta Alianza) → representante legal (anticipo de gastos) | 13.000.000 COP | 13.000.000 COP | 0 COP | 0 COP |
| FUND-GMF-REF26-2026 | Gravamen a los movimientos financieros retenido sobre las salidas del proyecto.<br>31/12/2026 · FUNDACION (cuenta Alianza) → impuesto GMF (4 x 1000) | 52.000 COP | 52.000 COP | 0 COP | 0 COP |
| FUND-RET-REF26-2026 | Retención en la fuente sobre los rendimientos del fondo.<br>31/12/2026 · FUNDACION (cuenta Alianza) → retención en la fuente | 6.137,69 COP | 6.137,69 COP | 0 COP | 0 COP |
| HC-46 | Factura de pasajes aéreos internacionales pagada por la SARL Sarramea, aporte en especie a la Fundación.<br>26/08/2026 · SARL Sarramea (mecenazgo de empresa) → aerolínea | 2.408,55 EUR | 2.408,55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| **Total COP** | | | | **13.058.137,69 COP** | **0 COP** |
| **Total EUR** | | | | **2.408,55 EUR** | **0 EUR** |

Lectura: la transferencia de anticipo se reparte entera entre las líneas de gasto de la misión; la suma de las líneas de cada salida es igual a su parte imputada, con diferencia cero.

## 10.5 Dinero que no pasó por la Fundación

Los paneles de guadua, la lona, los polines y las latillas se financiaron con la campaña del aliado, que recaudó más de 10 millones de pesos según el informe oficial. Ese dinero no pasó por la Fundación: no está en el total ni en la trazabilidad. Sus costos detallados pertenecen al aliado y no se publican.

## 10.6 Gastos olvidados o probables, y diferencias con el informe oficial

Lo que probablemente costó algo y no está en el total, o lo que está en el total sin pieza completa. Cada línea con su nivel.

| Gasto | Qué sabemos | Nivel | Tratamiento |
|---|---|---|---|
| Comunicación (8.000.000 COP previstos en el informe oficial) | Contenido, embajadoras, montaje, difusión e informe. Según el representante legal, el gasto real fue bastante mayor; a la fecha no hay salida identificada en la base que lo respalde. | sin cifra | Fuera del total hasta que se identifiquen las salidas. |



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

| Gasto | Qué sabemos | Nivel | Tratamiento |
|---|---|---|---|
| Ingresos de 4.500.000 COP del informe oficial | 3.000.000 de fondos propios y 1.500.000 de donaciones en cuenta, según el informe oficial. La base no identifica esas entradas. | declarado | Fuera de la trazabilidad; no documentado a la fecha de emisión. |
| Déficit de 11.600.000 COP « cubierto con aportes personales » | El informe oficial lo atribuía al representante legal. La base muestra que la Fundación le transfirió 13.000.000 COP para la misión. | declarado | No es un aporte personal neto mientras no se legalice. |
| Víveres | Entrega casa por casa a 175 familias; ningún recibo de compra. | declarado | Dentro del saldo declarado; sin soporte localizado, tratado como egreso declarado. |
| Tramo Rivera - Cali (combustible y peajes) | Ninguna estimación por falta de una fuente de distancia. | sin cifra | Fuera del total; no documentado a la fecha de emisión. |
| Seguro de los voluntarios | Ninguna pieza encontrada. | sin cifra | No documentado a la fecha de emisión. |

## 10.7 Por qué faltan algunos soportes

Una parte de los gastos se pagó en efectivo a pequeños proveedores rurales, en un país donde más de ocho de cada diez trabajadores del campo son informales (DANE, 2026). En Bajo Calima, el sismo había dejado además sectores sin energía (Defensoría del Pueblo). Muchos de esos vendedores no están obligados a facturar, y el documento que la ley pide en ese caso debía hacerse en la misma semana. La Fundación no fabrica ni antedata documentos: reúne las pruebas existentes, pide certificaciones con la fecha real y declara como tales los gastos sin soporte. Por la situación de seguridad del territorio, no se pidió a la comunidad que firmara constancias.

# 11. Dificultades y ajustes

- **El río sin lancha.** La lancha prevista para llegar a Chachajo (río San Juan) no estaba. Ajuste: destino cambiado en Buenaventura hacia Bajo Calima, accesible por carretera, con una escuela identificada y una comunidad implicada.
- **Sin madera en el sitio.** Ajuste: compra y corte en un aserradero de Buenaventura.
- **Mucha carretera, poca obra.** Cuatro días de carretera para tres días de obra.
- **Lluvia y calor** durante los tres días, y paneles llevados a mano.
- **Sin facturas.** No se conservaron facturas ni recibos durante la misión. Ajuste: reconstrucción en la base de datos y relación de gastos por firmar.
- **Una misión más larga que la obra.** La obra duró tres días, del 26 al 28 de septiembre según las fotos fechadas, pero la misión empezó unos 20 días antes con la preparación logística y continúa hasta la próxima misión de enero de 2027. La base no registra a la fecha ninguna salida propia de esas dos fases.
- **Cifras diferentes.** 146 casas destruidas según la lideresa, 142 según el Consejo Comunitario en la prensa; gastos estimados de 16.100.000 en el informe oficial frente al dinero realmente salido. Se citan todas las cifras con su fuente.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# 12. Aprendizajes y recomendaciones

*Hacer su parte: actuar antes de hablar, estar presentes en lugar de financiar a distancia.*

- La rapidez funcionó: menos de dos semanas entre la solicitud y la salida, y una comunidad que pasó de la desconfianza a la participación.
- La rapidez no excusa la falta de piezas: presupuesto escrito, responsable de caja y factura a nombre de la Fundación, siempre.
- Un convenio escrito con el aliado y con el Consejo Comunitario antes de salir protege a todos, también a la comunidad.
- Preguntar antes de llegar: los techos de las viviendas eran la primera necesidad del Consejo. Una evaluación corta con la comunidad orienta mejor la ayuda.
- Coordinarse con la Alcaldía y los grupos humanitarios evita duplicar aulas o carpas.
- Una comunidad que recibe ayuda necesita poder quejarse: un contacto y una pregunta en cada seguimiento.
- Proteger a los niños es también cuidar cómo se los muestra: autorización firmada, ningún nombre, imágenes de acción y no de angustia, código de conducta firmado.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# 13. Próximos pasos

| Acción | Responsable | Estado |
|---|---|---|
| Legalizar las transferencias de la misión con una relación de gastos firmada y los recibos que se puedan obtener (aserradero, finca, hoteles a nombre de la Fundación) | Representante legal y contador | por hacer |
| Seguimiento con el Consejo Comunitario: uso y estado de las aulas, quejas | Fundación | en curso |
| Fotos de las aulas terminadas y fecha de entrega | Aliado técnico | pendiente |
| Pedir al aliado el balance de su campaña de donaciones | Representante legal | por hacer |
| Misión 2027: destino elegido con la comunidad, convenio escrito, presupuesto previo, mecanismo de quejas, código de conducta | Fundación | propuesta |
| Campaña de donaciones 2027: presupuesto global estimado de 49.600.000 COP (estimación de la Fundación), tres niveles de aporte | Fundación | en curso |



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# Fotografías



*Montaje de un panel de guadua. Bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca, 28 de septiembre de 2026. · Fundación Phoenix Iniciative*



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org



*Los muros de guadua del refugio toman forma. Bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca, 28 de septiembre de 2026. · Fundación Phoenix Iniciative*



*Traslado de los pupitres hacia el aula provisional. Bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca, 28 de septiembre de 2026. · Fundación Phoenix Iniciative*



*Primer día de obra. Bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca, 26 de septiembre de 2026. · Fundación Phoenix Iniciative*



*Preparación de la ayuda para las familias. Bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca, 27 de septiembre de 2026. · Fundación Phoenix Iniciative*




*Un aula dañada por el sismo. Bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca, 28 de septiembre de 2026. · Fundación Phoenix Iniciative*



*Una calle de Bajo Calima después del sismo. Bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca, 28 de septiembre de 2026. · Fundación Phoenix Iniciative*

# 14. Anexos

Esta versión pública no incluye anexos: los documentos fuente contienen datos personales. Están en la versión completa, reservada al contador.



FUNDACION PHOENIX INICIATIVE · NIT 901899379-2 · Inscripción S0715224
Calle 5A n.° 6-30, Estación de Servicio Serviplus, Barrio Centro, Rivera, Huila, Colombia · contact@foundationphoenix.org

# Declaración de conformidad

Yo, representante legal de la FUNDACION PHOENIX INICIATIVE, declaro que este informe presenta de buena fe la misión « Un refugio para Bajo Calima y el Chocó » y el dinero realmente salido para ella, según los documentos disponibles a la fecha del informe. En particular:

- el total de 13.058.137,69 COP y el de 2.408,55 EUR son iguales, al centavo, a la ficha del proyecto en la base de datos de la Fundación, y nunca se suman entre sí;
- cada monto lleva su nivel de prueba; lo estimado está marcado como estimación y nunca supera el dinero realmente salido;
- los gastos estimados en el informe oficial que no corresponden a una salida real quedan fuera del total y se señalan en la sección 10.6;
- el número de familias atendidas es una declaración mía, sin lista de entrega;
- ningún nombre de niño ni de persona de la comunidad se publica, las imágenes publicadas cuentan con autorización firmada (declarado), y ningún costo del aliado técnico se presenta como gasto de la Fundación.



| | |
|---|---|
| **Firma** | Firmado por el representante legal, Benjamin Ravenel |
| **Nombre** | Benjamin Ravenel |
| **Calidad** | Representante legal, FUNDACION PHOENIX INICIATIVE (NIT 901899379-2) |
| **Lugar y fecha** | Rivera (Huila), 31 de octubre de 2026 |
